

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
FECHA:		1/02/2024		29/02/2024	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRY WALL UNA CARA	M2	121,02	\$ 45.418,60	\$ 5.496.740,65
1,04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	M3	12,66	\$ 950.000,00	\$ 12.024.150,00
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO	M2	845,03	\$ 27.963,62	\$ 23.630.041,88
1,09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO	M2	376,48	\$ 19.500,00	\$ 7.341.301,50
1,11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	7,81	\$ 52.348,38	\$ 408.971,72
1,15	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	117,00	\$ 45.000,00	\$ 5.265.000,00
1,16	DESMONTE DE LAVAMANOS Y APARATOS SANITARIOS	UND	35,00	\$ 32.000,00	\$ 1.120.000,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES				
2,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.715,85	\$ 68.500,00	\$ 117.535.767,81
6	MAMPOSTERÍA				
6,01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	280,90		
NP	ITEM NO PREVISTOS				
NP1	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCIO 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	155,00	\$ 570.506,00	\$ 88.428.430,00
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	29,06	\$ 795.530,16	\$ 23.120.095,28
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	8,96	\$ 1.006.187,28	\$ 9.011.413,28
Valor costos Directos				\$	318.492.949,67
Administracion				29%	\$ 92.362.955,41
Imprevistos				1%	\$ 3.184.929,50
Utilidad				5%	\$ 15.924.647,48
Valor costos Indirectos				\$	111.472.532,39
Valor Total				\$	429.965.482,06
Valor costos Directos Equipos					
Administracion				29%	\$ -
Valor Total Equipos				\$	-
A. Valor total actividades Ejecutadas				\$	429.965.482,06
B. Valor total presupuesto de obra y Contingencia				\$	64.693.471.857,36
C. Porcentaje de avance Ejecutado (A/B)					0,66%

CAPITULO 1							
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO PTO OBRA							
CAPITULO:	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRY WALL UNA CARA					UNIDAD	CANT. TOTAL
ITEM	1,02					M2	715,00
	LOCALIZACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN		CANTIDAD
	SEMANA 2						
UCI							
	PLAZOLETA	49,60		2,44		121,02	121,02
TOTAL							121,02
REGISTRO FOTOGRÁFICO / REFERENCIA							

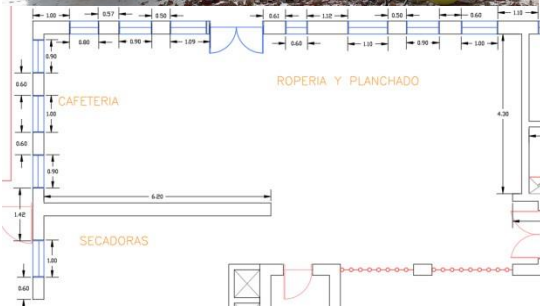



CAPITULO 1							
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO PTO OBRA							
CAPITULO	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO					UNIDAD	CANT. TOTAL
ITEM	1,04					M3	98,50
LOCALIZACIÓ N		LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		CANTIDAD
SEMANA 3							
MODULO E							
VIGA DE AMARRE		3	0,25	0,3	7	1,58	1,58
MODULO B							
VIGA DE AMARRE PERIMETRAL		72,00	0,25	0,30	1,00	5,40	5,40
VIGA DE AMARRE CENTRAL		4,68	0,25	0,30	2,00	0,70	0,70
MODULO D							
VIGA DE AMARRE PERIMETRAL		66,40	0,25	0,30	1,00	4,98	4,98
TOTAL							12,66
REGISTRO FOTOGRÁFICO / REFERENCIA							



CAPITULO 1						
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO PTO OBRA						
CAPITULO:	DEMOLICION DE MUROS TABICON TOLETE COMUN 25CM, INCLUYE RETIRO				UNIDAD	CANT. TOTAL
ITEM	1,07				M2	270,00
LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD
SEMANA 1						
UCI						
MURO PERIMETRAL EXTERIOR		13,60		3	40,80	40,80
MODULO D						
AUDITORIO		2,10		3,5	7,35	7,35
		1,85		3,5	6,475	6,48
		6,53		3,5	22,855	22,86
		6,30		3,5	22,05	22,05
		4,55		3,5	15,925	15,93
		7,20		3,5	25,2	25,20
		0,45		3,5	1,575	1,58
		0,60		3,5	2,1	2,10
NUTRICION		5,57		2,7	15,039	15,04
		2,10		3,50	7,35	7,35
		0,38		3,50	1,33	1,33
CONSULTORIO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		1,62		2,70	4,374	4,37
		7,28		3,50	25,48	25,48
		0,60		3,50	2,10	2,10
		0,40		3,50	1,40	1,40
		0,90		3,50	3,15	3,15
		0,80		3,50	2,80	2,80
		1,25		3,50	4,38	4,38
		1,50		3,50	5,25	5,25
		1,70		3,50	5,95	5,95
		1,95		3,50	6,83	6,83
		1,55		3,50	5,43	5,43
		1,95		3,50	6,83	6,83
		5,55		3,50	19,43	19,43
		0,50		3,50	1,75	1,75
		3,60		2,70	9,72	9,72
BAÑOS PUBLICOS		1,80		3,50	6,30	6,30
		4,35		3,50	15,23	15,23
		0,80		3,50	2,80	2,80
		0,80		3,50	2,80	2,80
		0,80		3,50	2,80	2,80
		1,40		3,50	4,90	4,90
		1,20		3,50	4,20	4,20
		1,05		3,50	3,68	3,68
		1,33		2,70	3,59	3,59
CONSULTORIO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		5,00		3,50	17,50	17,50
		4,05		3,50	14,18	14,18
		2,00		3,50	7,00	7,00
		5,90		3,50	20,65	20,65
		0,70		3,50	2,45	2,45
		0,70		3,50	2,45	2,45
		0,45		3,50	1,58	1,58
		1,00		2,70	2,70	2,70
		1,00		2,70	2,70	2,70
CONSULTORIO		1,00		2,70	2,70	2,70
		0,45		3,50	1,58	1,58
		0,40		3,50	1,40	1,40
		1,15		3,50	4,03	4,03
		1,20		3,50	4,20	4,20
		2,39		3,50	8,37	8,37
		1,00		2,70	2,70	2,70

CAPITULO 1						
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO PTO OBRA						
CAPITULO:	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO				UNIDAD	CANT. TOTAL
ITEM	1,07				M2	270,00
LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD
SEMANA 2						
MODULO E						
SALA DE OBSERVACION		1,75		4,20		7,35
		1,80		4,20		7,56
		1,80		4,20		7,56
		2,85		4,20		11,97
		1,09		4,20		4,58
		2,85		4,20		11,97
		1,80		4,20		7,56
		1,80		4,20		7,56
		0,28		4,20		1,18
		0,70		4,20		2,94
		10,70		4,20		44,94
CONSULTORIO 2		4,25		4,20		17,85
		0,50		4,20		2,10
		1,62		4,20		6,80
		3,15		4,20		13,23
CONSULTORIO 1		0,98		4,20		4,12
		0,98		4,20		4,12
		2,49		4,20		10,46
		2,88		4,20		12,10
		2,45		4,20		10,29
SEMANA 3						
MODULO B						
ROPERIA Y PLANCHADO		0,60		3,20		1,92
		1,42		3,20		4,54
		6,20		3,20		19,84
		0,60		3,20		1,92
		0,60		3,20		1,92
		1,00		3,20		3,20
		0,57		3,20		1,82
		0,50		3,20		1,60
		0,61		3,20		1,95
		1,12		3,20		3,58
		0,50		3,20		1,60
		0,60		3,20		1,92
		1,10		3,20		3,52
		1,00		2,70		2,70
		0,90		2,70		2,43
		1,00		2,70		2,70
		0,90		2,70		2,43
		0,80		2,70		2,16
		0,90		2,70		2,43
		1,09		2,70		2,94
		0,60		2,70		1,62
		1,10		2,70		2,97
		0,90		2,70		2,43
		1,00		2,70		2,70
UNIDOSIS		4,30		3,20		13,76
		2,17		3,20		6,94
		1,02		3,20		3,26
		1,15		2,70		3,11
		2,62		3,20		8,38
OFICINA ALMACEN		4,85		3,20		15,52
		1,04		3,20		3,33
		1,27		3,20		4,06
ALMACEN MEDICAMENTOS - DISPOSITIVOS MEDICOS - ALMACEN		1,10		3,20		3,52
		3,50		3,20		11,20
		2,55		3,20		8,16
		5,99		3,20		19,17
		2,45		3,20		7,84
		2,02		3,20		6,46
		2,22		3,20		7,10
		1,52		3,20		4,86
		2,75		3,20		8,80
		1,87		3,20		5,98
		1,15		2,70		3,11
		1,15		2,70		3,11
		1,15		2,70		3,11
					TOTAL	845,03

CAPITULO 1					
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO PTO OBRA					
CAPITULO:	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO				UNIDAD
ITEM	1,07				CANT. TOTAL
LOCALIZACIÓN				M2	CANTIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO / REFERENCIA					
<div></div>					

