



**Contrato:** CW149224  
**Descripción:** Modernización CC ESSA  
**Comienzo:** 09-11-21  
**Fin:** 04-10-22  
**Duración:** 248 días  
**Seguimiento a:** 21-11-21  
**% Esperado:** 0,78%  
**% Ejecutado:** 1,44%  
**% Variación:** 0,67%

## Reporte de Seguimiento Ejecutivo Contrato CW149224

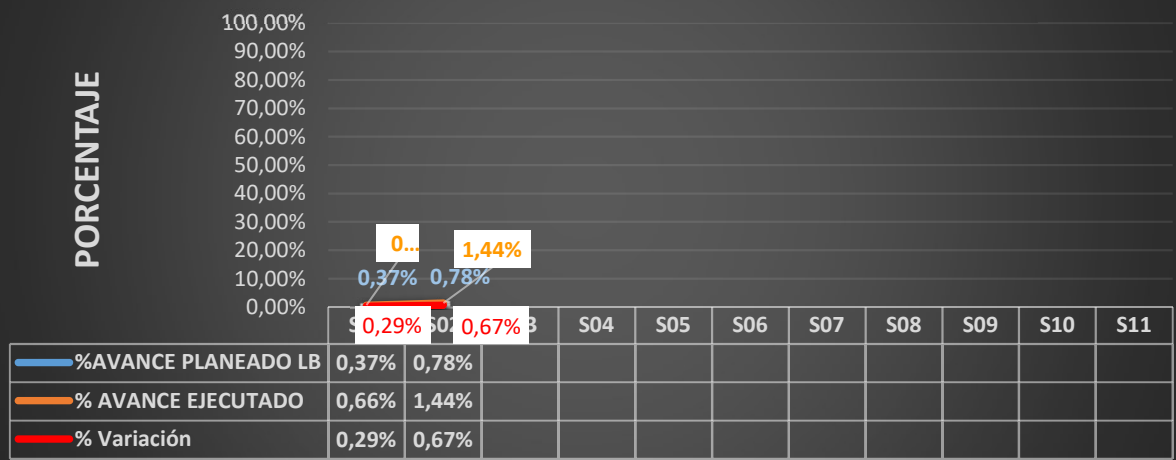


### SEGUIMIENTOS EN EL TIEMPO

## Ponderación entregables Contrato CW149224

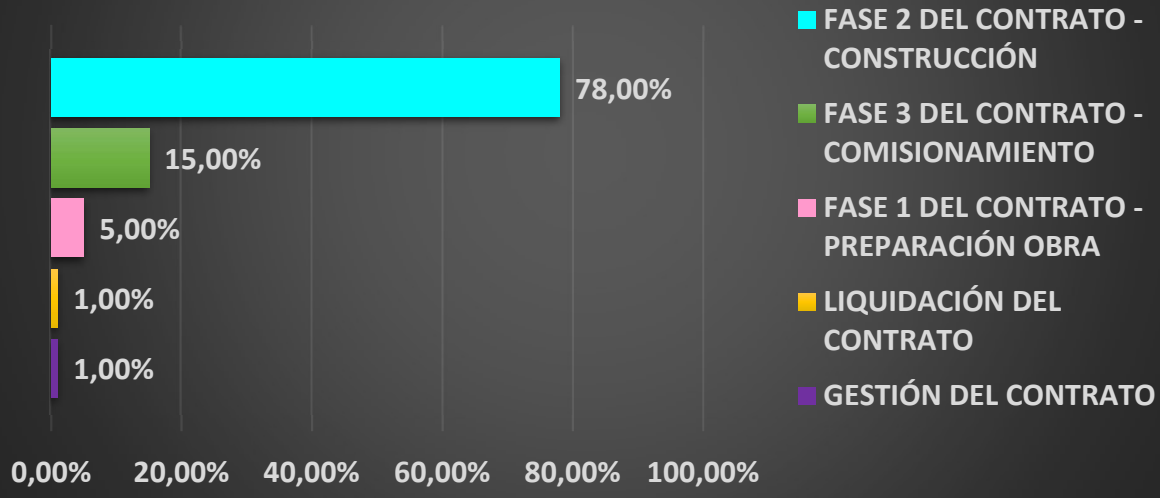

## Variación Entregables Contrato CW149224

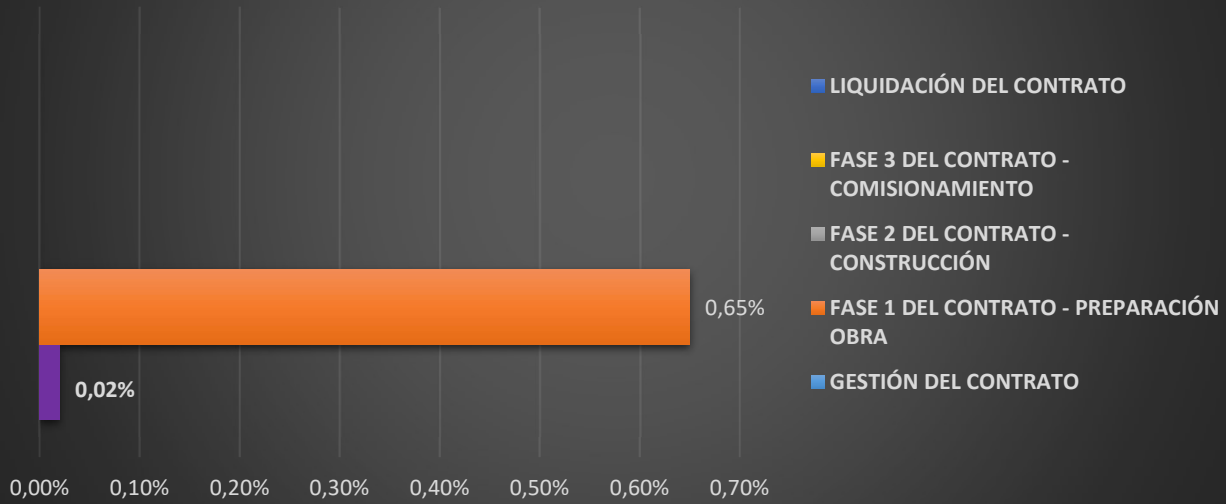

## Terminación Entregables Contrato 149224

