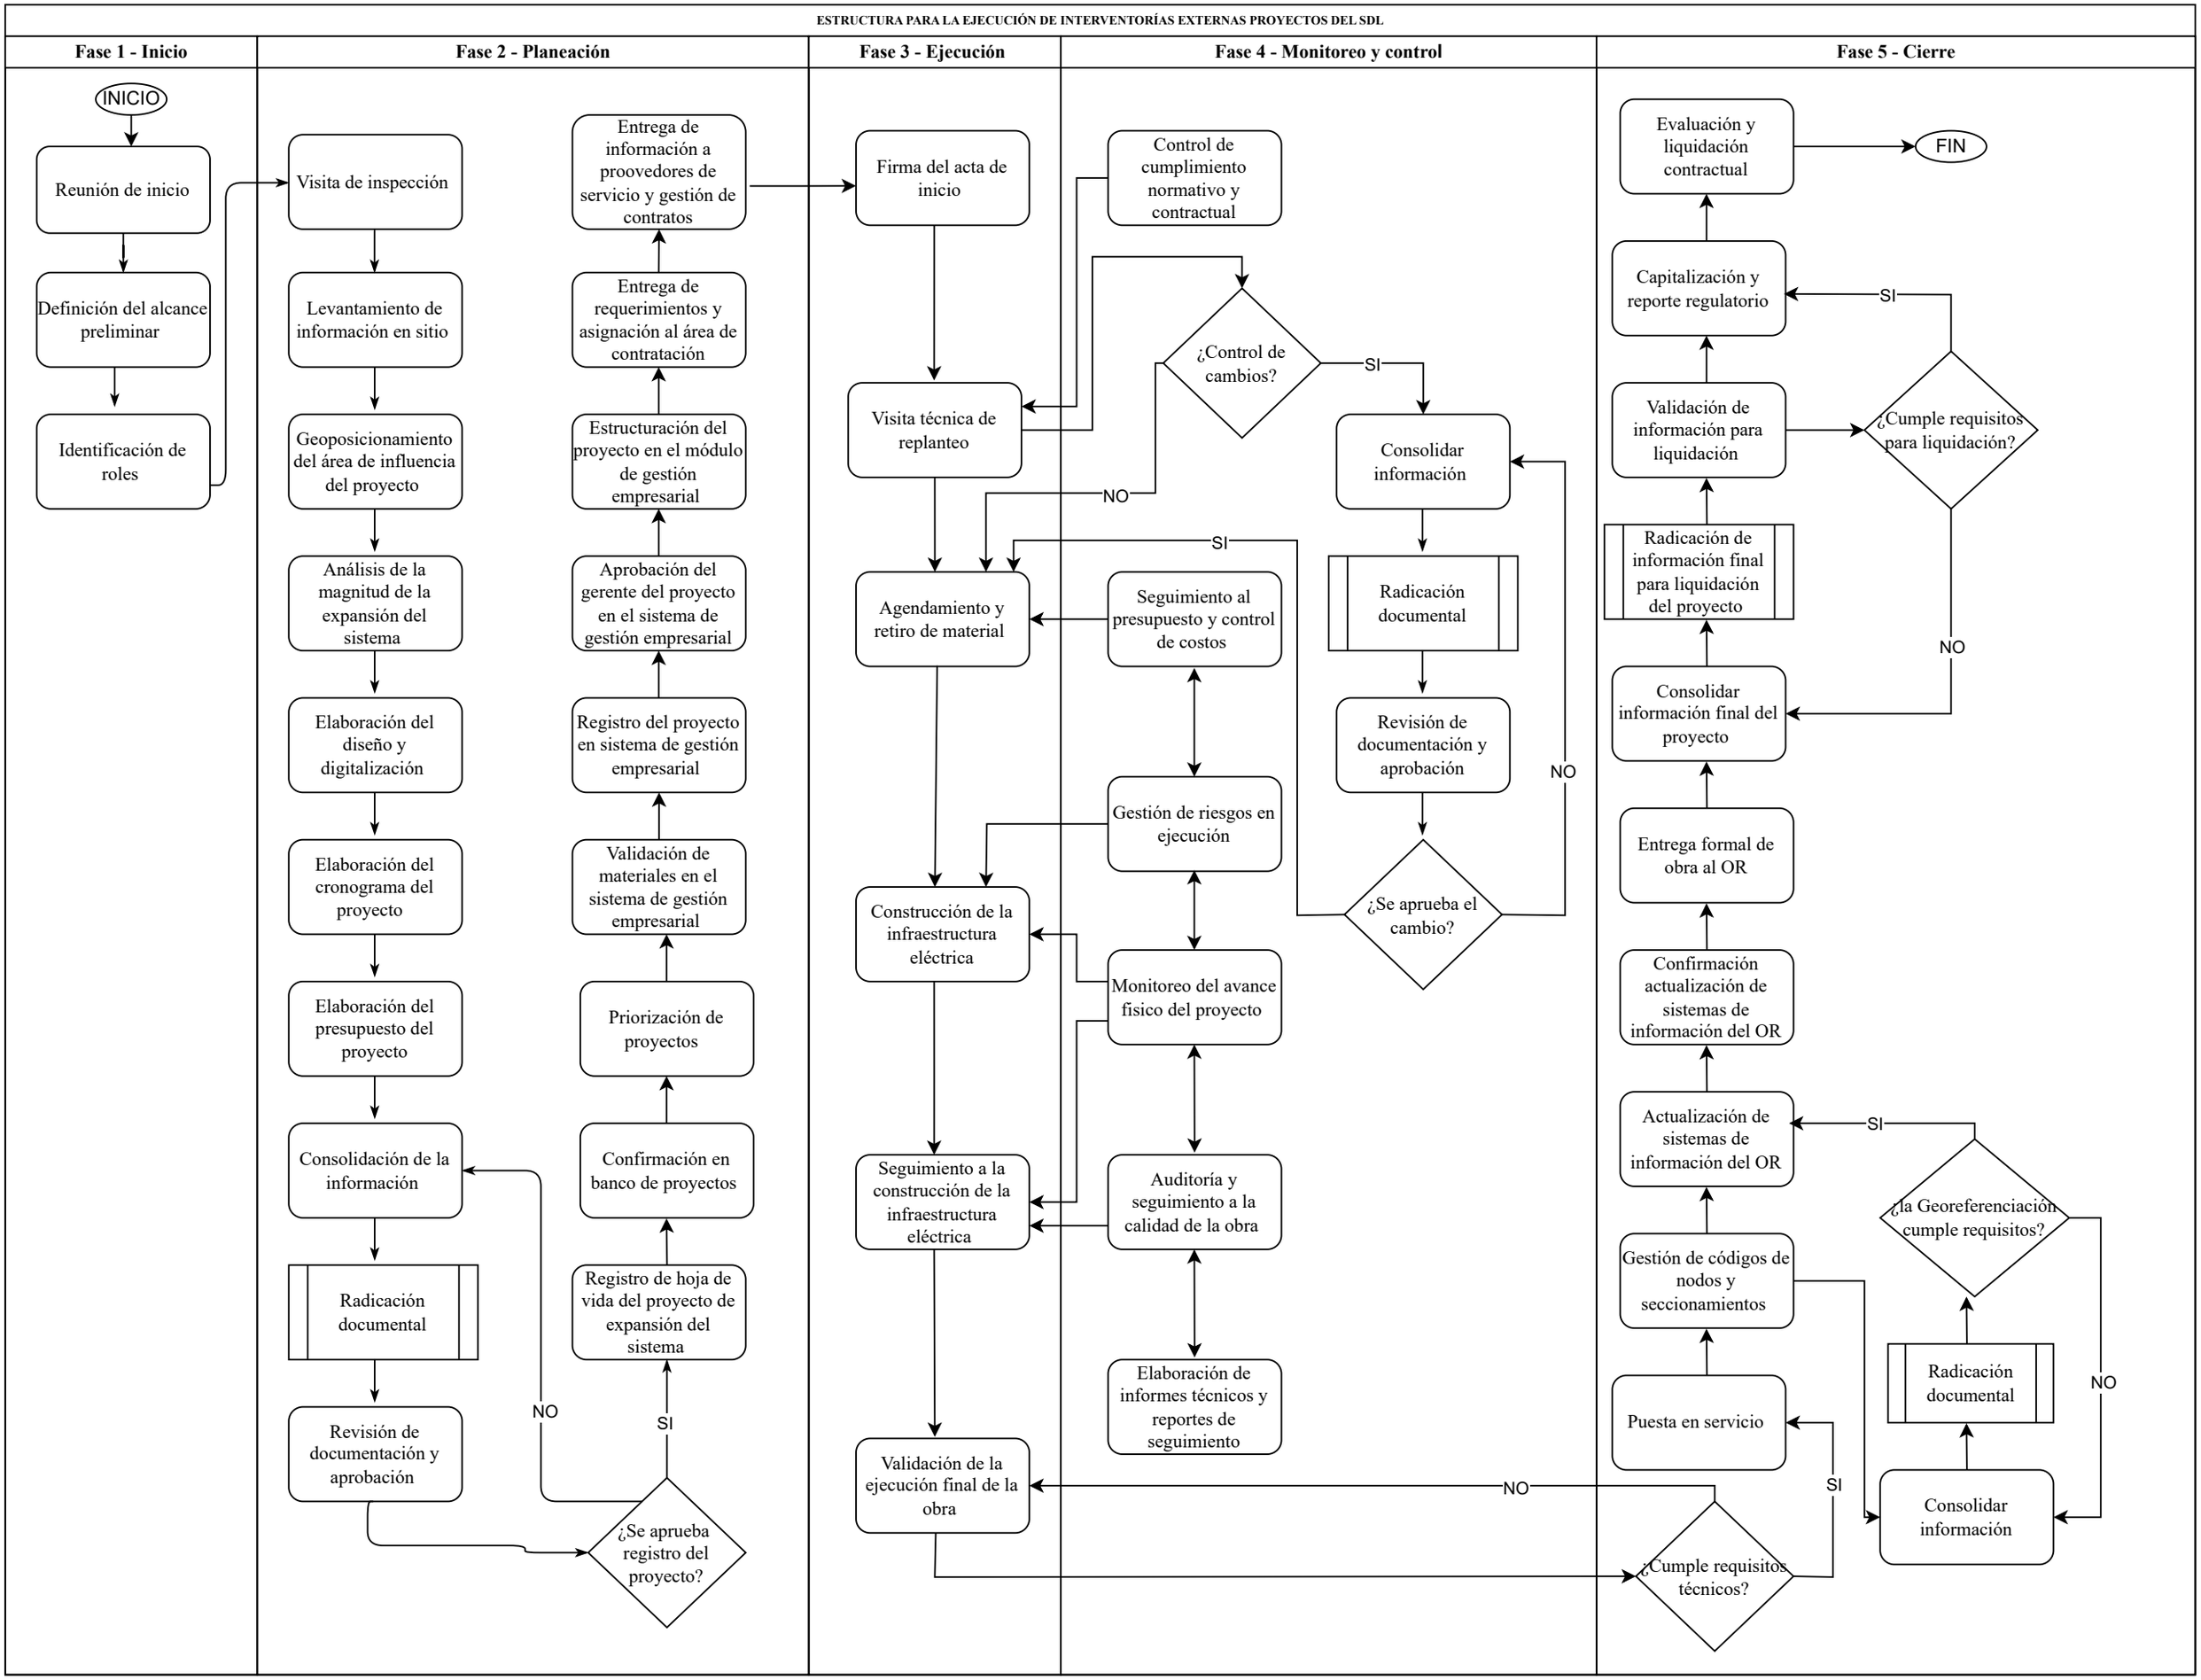
ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍAS EXTERNAS PROYECTOS DEL SDL
Fase 1 - Inicio
Fase 2 - Planeación
Fase 3 - Ejecución
Fase 4 - Monitoreo y control
Fase 5 - Cierre
INICIO
Reunión de inicio
Definición del alcance preliminar
Identificación de roles
Visita de inspección
Levantamiento de información en sitio
Geoposicionamiento del área de influencia del proyecto
Análisis de la magnitud de la expansión del sistema
Elaboración del diseño y digitalización
Elaboración del cronograma del proyecto
Elaboración del presupuesto del proyecto
Consolidación de la información
Radicación documental
Revisión de documentación y aprobación
¿Se aprueba registro del proyecto?
NO
SI
Registro de hoja de vida del proyecto de expansión del sistema
Confirmación en banco de proyectos
Priorización de proyectos
Validación de materiales en el sistema de gestión empresarial
Registro del proyecto en sistema de gestión empresarial
Aprobación del gerente del proyecto en el sistema de gestión empresarial
Estructuración del proyecto en el módulo de gestión empresarial
Entrega de requerimientos y asignación al área de contratación
Entrega de información a proovedores de servicio y gestión de contratos
Firma del acta de inicio
Visita técnica de replanteo
Agendamiento y retiro de material
Construcción de la infraestructura eléctrica
Seguimiento a la construcción de la infraestructura eléctrica
Validación de la ejecución final de la obra
Control de cumplimiento normativo y contractual
¿Control de cambios?
SI
NO
Consolidar información
Radicación documental
Revisión de documentación y aprobación
¿Se aprueba el cambio?
NO
SI
Seguimiento al presupuesto y control de costos
Gestión de riesgos en ejecución
Monitoreo del avance fisico del proyecto
Auditoría y seguimiento a la calidad de la obra
Elaboración de informes técnicos y reportes de seguimiento
NO
¿Cumple requisitos técnicos?
SI
Puesta en servicio
Gestión de códigos de nodos y seccionamientos
Actualización de sistemas de información del OR
SI
Confirmación actualización de sistemas de información del OR
Entrega formal de obra al OR
Consolidar información final del proyecto
Radicación de información final para liquidación del proyecto
Validación de información para liquidación
¿Cumple requisitos para liquidación?
SI
NO
Capitalización y reporte regulatorio
Evaluación y liquidación contractual
FIN
¿la Georeferenciación cumple requisitos?
NO
Radicación documental
Consolidar información
